

Alla data del 22/04/2024 possiamo riscontrare il seguente stato avanzamento lavori.

### ALMA-CLASSROOM

Interventi effettuati:

- Pittura Aule. *Nel progetto iniziale erano previste 21 aule dove pitturare solo la parete lato docente. In fase di esecuzione, insieme al DS, si è deciso di pitturare tutte le pareti di un numero ristretto di aule, individuate tutte al primo piano della sete ITI.*

Materiali consegnati:

- E' Stato consegnato gran parte del materiale previsto ed è depositato presso il magazzino dell'istituto (vedi elenco/bolle presso ufficio tecnico)

Lavori ancora da fare:

#### 10 AULE DIGITALI EX-NOVO

- Installazione Monitor TV, Casse Acustiche, Cattedra Porta-Notebook, Poltroncina, Notebook, Cavi (hdmi, usb) e canaline. Vengono individuate le seguenti aule, tutte dislocate presso il Piano Terra del Liceo Scientifico:

5BE, 2C, 2D, 3AC, 5AE, 4A IP, 2A IP, 5D IP, 3A IP, 3D IP

*Nelle aule sono già presenti Lim, Scrivania Porta-Computer e Computer che vanno smontati e posizionati in luogo individuato dall'ufficio tecnico*




#### 11 AULE DIGITALI DA MIGLIORARE

- Installazione Casse Acustiche, Cattedra Porta-Notebook, Poltroncina, Notebook, Cavi (hdmi, usb) e canaline. Vengono individuate le seguenti aule:  
Presso Liceo Primo Piano: 3AM, 4BM, 3BM, 4D IP  
*In queste 4 aule sono già presenti i Monitor TV che vanno collegati alle nuove attrezzature.*

Presso ITI Piano Terra: 1B, 1E, 1D, 1F, 1A, 1A IP, 1D IP

*In queste 7 aule sono già presenti i Monitor TV, che vanno collegati alle nuove attrezzature.*

***Sono presenti poi: scrivania porta-computer e computer che vanno smontati e posizionati in luogo individuato dall'ufficio tecnico.***

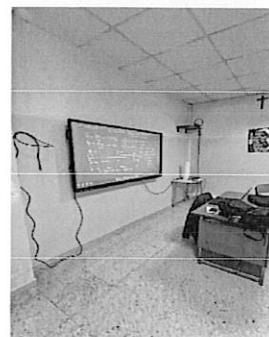

## 1 AULA TEMATICA STEM

L'aula individuata per realizzare l'ambiente per le discipline STEM è l'aula n. 29, posta al Secondo Piano dell'ITT Alessandrini.


Lavori effettuati:

- Tinteggiatura Pareti laterali, senza zoccolatura, senza il soffitto e senza radiatori.

Lavori da fare:

- Installazione Monitor TV, Casse Acustiche, Scrivania Docente, Poltroncina, Computer Docente, Monitor Docente, 24 Tavoli Alunni, 24 Sedute alunni, 4 Banchi Centrali Esagonali, 24 Notebook, 8 Visori, 1 carrello ricarica Notebook, 1 Libreria bassa, cavi e canaline.

*Nella Parete è presente un Monitor TV che va smontato*

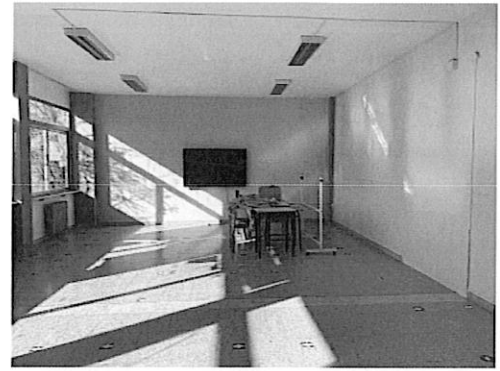

## 1 AULA TEMATICA UMANISTICA e STORICO-SOCIALE

Inizialmente l'aula individuata per realizzare l'ambiente per le discipline Umanistiche e Storico-Sociale era la nuova aula che deve essere ricavata presso la zona dei laboratori, vicino il laboratorio di chimica, unendo 2 aule, attualmente utilizzate come deposito materiali. Da un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi con il DS e l'ufficio tecnico si è verificato che risulta adatta anche l'aula attualmente utilizzata per la robotica.

Lavori da fare:

- Svuotare l'aula dai materiali di robotica e posizionarli in aula 3.0;

### **A cura della ditta fornitrice PNRR:**

- Smontare la LIM e la postazione Docente;
- Installazione Monitor TV, Casse Acustiche, Scrivania Docente, Poltroncina, Computer Docente, Monitor Docente, 24 Tavoli Alunni, 4 Banchi Centrali Esagonali, 24 Notebook, 24 Sedute alunni, 8 Visori, 1 carrello ricarica Notebook, 1 Libreria bassa, cavi e canaline.

### **Con la ditta fornitrice occorre verificare:**

- Importo Lavori già effettuati dall'azienda incaricata per la pittura delle aule e determinare eventuale importo a carico della scuola;
- Quando e come si procederà alla fine dei lavori;
- Chi provvede allo smontaggio delle LIM e delle scrivanie laddove siano presenti;
- Una volta smontata l'eventuale LIM, chi provvede a pitturare la parete che risulterà scoperta dal monitor.

TERAMO, lì 22/04/2024

**I Progettisti**

Acciaio Settimio

Centinaro Alfredo

Protocollo numero 0007171/2024 del 30/04/2024 ore 11:22:37

Stato avanzamento Lavori - PNRR Classroom

**ACCIAIO SETTIMIO** (acciaio.settimio@iisteramo.edu.it)

RICEVUTO il 30/04/2024  
08:59:36



**A:** teis00900d@istruzione.it, Tecnico Ufficio (ufficiotecnico@iisteramo.edu.it)

---

In allegato inviamo una relazione dettagliata dello stato avanzamento lavori per il progetto ALMA-Classroom.

Si chiede di sollecitare l'azienda fornitrice al completamento dei lavori così come indicato nel nostro progetto iniziale e successivo affidamento da parte della scuola.

In Fede.

A nome dei progettisti:  
Acciaio Settimio  
Centinaro Alfredo

---

1 allegato

classroom.pdf
